


# Beschlussvorlage

Fachbereich:	FB Z3 Finanzen	Datum:	27.03.2015
Berichterstatter:	Alt, Jürgen	AZ:	Z 32
		<b>Vorlage Nr.:</b>	<b>040/2015</b>

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Behandlung</b>
Bauausschuss	15.04.2015	öffentlich - Entscheidung

## Kreisstraße CO 16; Deckenbau zwischen Rothenberg und Unterelldorf

### I. Sachverhalt

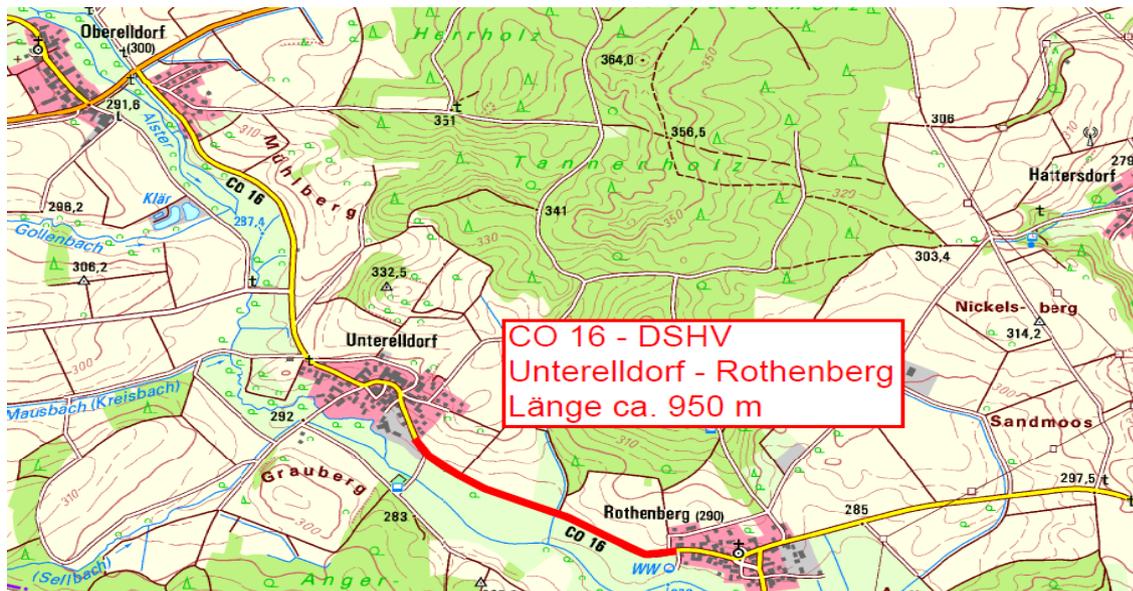

Die Deckenbaumaßnahme wurde nach der vom Bauausschuss am 21.11.2013 beschlossenen Prioritätenlisten für das Jahr 2015 eingeplant und entsprechend im Investitionsprogramm aufgenommen. Hierfür sind im Haushaltsentwurf für 2015 Mittel von 90.000,00 € eingestellt.

Die Kreisstraße wurde 1978 im Bereich von Rothenberg bis Unterelldorf ausgebaut und vor einiger Zeit mit einer Oberflächenbehandlung versehen. Die Oberflächenbehandlung ist mittlerweile stark verschlissen und stellenweise vollständig abgefahren. Die Tragfähigkeit der Straße ist aber noch ausreichend, weil keine großen Verformungen der Fahrbahn zu erkennen sind. Somit kann durch eine Erhaltungsmaßnahme die Verkehrssicherheit wieder ausreichend erhöht werden.

Ein nochmaliges Aufbringen einer Oberflächenbehandlung führt durch Bindemittelanreicherungen zu Problemen bei der Griffigkeit, deshalb wird die Decke teilweise erneuert. Im Sanierungsbereich wird die Verschleißschicht der Fahrbahn zwei Zentimeter dick abgefräst und durch eine dünne Deckschicht im Heißeinbau ersetzt. Mit diesem Verfahren liegen gute Erfahrungen aus dem Jahr 2013 vor, als diese Bauweise auf der Kreisstraße CO 4 im Bereich von Grattstadt bis Ottowind angewandt wurde.

Die Planung wird im Fachbereich Tiefbau durchgeführt und die Ausführung sollte in Verbindung mit dem Ausbau der OD Oberelldorf Siedlung im zweiten Halbjahr 2015 erfolgen. Wegen der Erreichbarkeit von Unterelldorf konnte diese Absicht nicht umgesetzt werden und die Deckschicht muss vor Beginn der Bauarbeiten in Oberelldorf fertig gestellt werden. Wegen der zeitlichen Abhängigkeiten wurden die Bauarbeiten bereits ausgeschrieben und am 26. März 2015 erfolgte die Submission. Es wurden sechs Firmen

zur Angebotsabgabe aufgefordert, vier Bieter haben Angebote abgegeben. Das wirtschaftlichste Angebot liegt ungeprüft bei 77.729,78 €. Damit liegt die Vergabesumme unter den im Haushaltsentwurf für 2015 angesetzten Kosten in Höhe von 90.000 €.

Um die Deckenbauarbeiten wie vorgesehen in den Pfingstferien 2015 durchführen zu können, ist eine zeitnahe Vergabe unabdingbar.

## **II. Beschlussvorschlag**

Die Verwaltung wird beauftragt die Arbeiten für die Deckenbaumaßnahme an der Kreisstraße CO 16 zwischen Rothenberg und Unterelldorf auf das annehmbarste Angebot zu vergeben. Zur Auftragserteilung wird der Landrat ermächtigt und beauftragt.

Die anfallenden Kosten sind aus der Haushaltsstelle 6500.9516 des Vermögenshaushaltes 2015 zu bezahlen.

III. In Finanzangelegenheiten  
an FB Z3  
mit der Bitte um Mitzeichnung. ....

IV. An FBL Tiefbau  
mit der Bitte um Mitzeichnung. ....

V. An GBZ  
mit der Bitte um Mitzeichnung.  
- immer erforderlich - .....

VI. WV am Sitzungstag beim zuständigen Sitzungsdienst.

VII. Zum Akt/Vorgang

Gabriele Seifart

Landratsamt Coburg

Michael Busch  
Landrat
