


Beschlussvorlage

Fachbereich:	FB Z3 Finanzen	Datum:	27.06.2023
Berichterstattung:	Alt, Jürgen	AZ:	FB 43
		Vorlage Nr.:	148/2023

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Bauausschuss	11.07.2023	öffentlich - Entscheidung

Kreisstraße CO 12; Neuanlage eines Geh- und Radweges Schafhof - Wohlbach mit Deckenbau

Sachverhalt

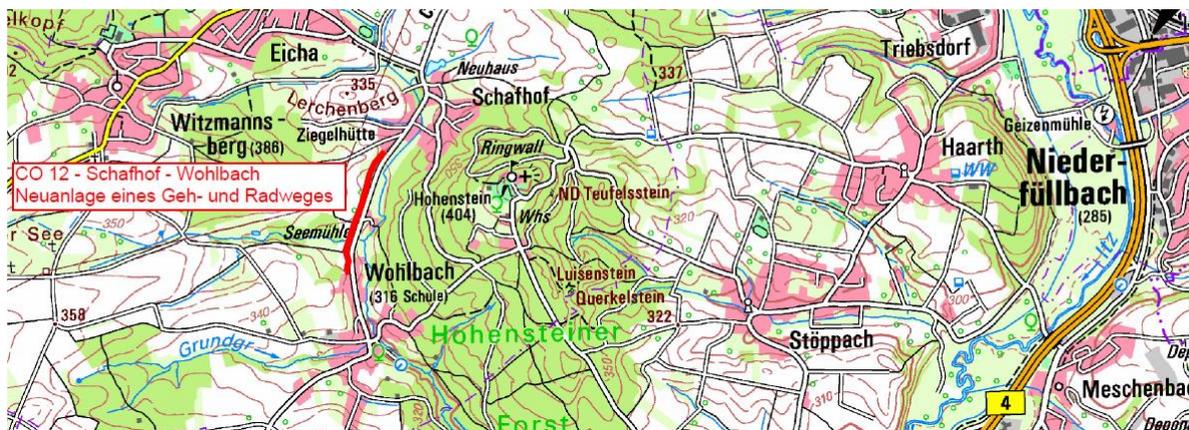

Im derzeit gültigen, am 16.02.2023 beschlossenen Investitionsprogramm 2022 bis 2026 des Landkreises Coburg ist unter laufender Nummer 90 die Neuanlage des Geh- und Radweges von Schafhof nach Wohlbach vorgesehen.

Die Gemeinschaftsmaßnahme, bei der die Gemeinde Ahorn einen Gehweglückenschluss in Wohlbach, eine Abwasserdruckleitung und Maßnahmen der Flurentwässerung mit durchführt, wurde vom Landkreis am 12.05.2023 öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am 01.06.2023 wurden nur zwei Angebote abgegeben, das günstigste in Höhe von 2.852.851,09 € lag ca. 76 % über der Kostenberechnung. Für die einzelnen Teilleistungen wurden in diesem Angebot folgende Preise erzielt:

Geh- und Radweg, Fördermaßnahme Landkreis	1.405.615,86€	+ ca. 78 %
Gehweg Fördermaßnahme Gemeinde	129.874,84€	+ ca. 121 %
Deckenbau und Durchlasssanierung Landkreis	396.722,55€	+ ca. 118 %
Druckleitung Gemeinde	846.200,08€	+ ca. 53 %
Flurentwässerung Gemeinde	74.437,77€	+ ca. 74 %

Die Prüfung der Unterlagen zur Kostenberechnung ergab keine Fehler oder Unstimmigkeiten. Im Haushalt des Landkreises sind für die Maßnahme nur Mittel in Höhe von 1.120.000 € eingestellt, es werden aber 1.802.338,41 € benötigt. Da weder die Gemeinde noch der Landkreis die erforderlichen Haushaltsmittel bereitgestellt haben, soll nach Abstimmung mit der Gemeinde die Ausschreibung aufgehoben werden. Der entsprechende Gemeinderatsbeschluss soll am 27. Juni erfolgen.

Nach Überarbeitung der Ausschreibungsunterlagen mit der Möglichkeit der losweisen Vergabe sollen die Arbeiten im Herbst 2023 nochmals öffentlich ausgeschrieben werden. Als neuer Baubeginn wird März 2024 vorgesehen. Davon erhoffen sich Landkreis und Gemeinde eine breitere Streuung der Angebote und günstigere Preise.

Ressourcen

Die laufende Maßnahme ist eine Pflichtaufgabe im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Landkreises.

Die erforderlichen Eigenmittel stehen im Investitionsplan 2022 bis 2026 unter der Haushaltsstelle 1.6512.9503 nicht zur Verfügung.

Weitere Personalkapazitäten werden nicht benötigt.

Die räumliche Unterbringung (einschl. Infrastruktur) ist gesichert.

Beschlussvorschlag

Die Ausschreibung der Baumaßnahme Kreisstraße CO 12, Geh- und Radweg Schafhof – Wohlbach wird wegen nicht ausreichender Haushaltsmittel aufgehoben.

Nach Überarbeitung der Ausschreibungsunterlagen sollen die Arbeiten im Herbst 2023 mit der Möglichkeit einer losweisen Vergabe nochmals öffentlich ausgeschrieben werden.

In Finanzangelegenheiten
an FB Z3
mit der Bitte um Mitzeichnung.

.....

An GBL / FBL
mit der Bitte um Mitzeichnung.

.....

In Finanz- und Personalangelegenheiten
an GBL Z
mit der Bitte um Mitzeichnung

.....

An Büro Landrat
mit der Bitte um Mitzeichnung.
- immer erforderlich -

.....

WV am Sitzungstag beim zuständigen Sitzungsdienst.

Zum Akt/Vorgang

Jürgen Alt
(Unterschrift Vorlagenersteller)

Landratsamt Coburg

Sebastian Straubel
Landrat
